


CINECA

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE DELLA DIRETTRICE GENERALE

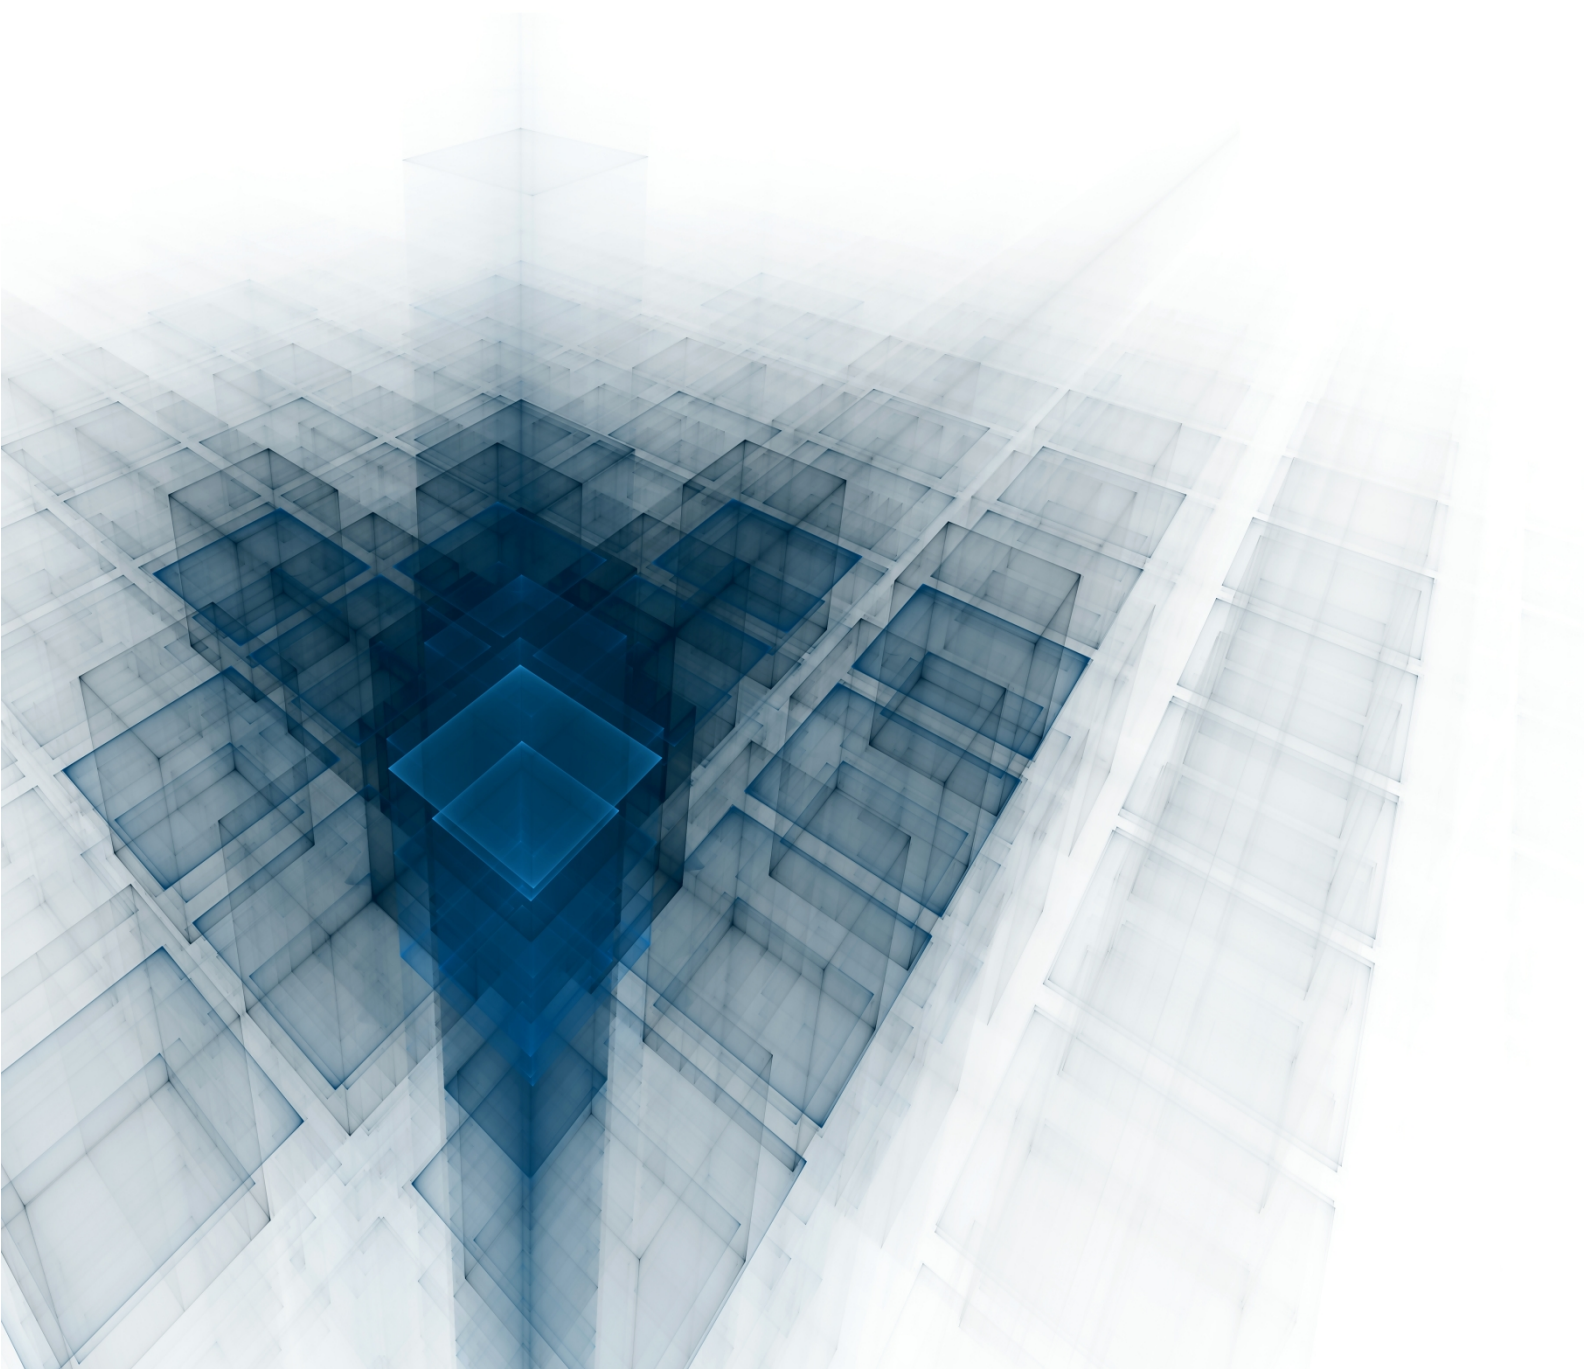

La Direttrice Generale Dott.ssa Alessandra Poggiani, su proposta di Massimo Mauri in qualità di
Responsabile Unico di Progetto nominato con Determina n. 77 del 28/02/2025

Premesso che:

- ⌚ è in essere tra CINECA e l'Operatore TECTRE S.R.L. (CF. 03533961201 P.IVA 03533961201) con sede legale in Bologna (BO) via Dei Lapidari 16/B, un contratto avente ad oggetto “SERVIZIO DI RIATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIALI DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI E CONTROLLO ACCESSI PER LA SALA CED DI CASALECCHIO DI RENO – CIG B62398D579” (G01013), di importo pari ad € 126.370,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi), compensato “a corpo”, e con durata pari a 120 giorni;
- ⌚ nella notte del 19 ottobre 2024 le grandi precipitazioni hanno fatto collassare il sistema idrico della zona industriale di Casalecchio di Reno, determinando l'allagamento completo dell'interrato della sede di Via Magnanelli 6/3 di circa 1000 mq, impattando sulla continuità generale di erogazione dei servizi essenziali forniti dal Cineca a tutti gli enti consorziati;
- ⌚ considerato che al fine di far fronte all'evento sopra descritto è stato eseguito un progetto denominato “Soluzione 2E” volto al ripristino tecnico dei locali danneggiati dall'alluvione;
- ⌚ il servizio oggetto del contratto in parola ricomprende la riattivazione degli impianti speciali di rilevazione e spegnimento incendi, nonché del sistema di controllo accessi della sala CED, interessata dal predetto evento alluvionale, risulta pertanto strettamente connesso ai tempi di completamento della “Soluzione 2E”;

Tenuto conto che:

- ⌚ a fronte di tutto quanto sopra, ed in ragione dei ritardi imprevedibili creatisi nei lavori di realizzazione della cosiddetta “soluzione 2e” che hanno parimenti determinato, in fase di esecuzione contrattuale, un conseguente rallentamento nell'ultimazione delle attività previste dal contratto (G01013), si rende pertanto necessaria una proroga temporale del contratto fino al 31/12/2025, nelle more della conclusione della predetta “soluzione 2e”;

Valutato che:

- ⌚ tali modifiche rientrano nell'ipotesi di cui all' art. 120, comma 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023, in combinato disposto con le previsioni contrattuali di cui all'art. 7;

Visti:

- ⌚ l'art. 7 del contratto in essere relativo alla procedura G01013;
- ⌚ l'art. 120 comma 1 lett. c) del d.lgs. 36/2023;
- ⌚ la procura rilasciata in data 20/09/2023 alla sottoscritta, quale Direttrice Generale;

Determina

- ⌚ che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
- ⌚ di autorizzare il RUP arch. Massimo Mauri a procedere con le attività di formalizzazione della modifica del contratto descritto in premessa e nei termini sopra citati con estensione della durata contrattuale fino al 31/12/2025;
- ⌚ di autorizzare le necessarie modifiche del CIG;
- ⌚ che la formalizzazione avverrà per il tramite del Portale Appalti del CINECA;
- ⌚ che la presente venga pubblicata in applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023;

Casalecchio di Reno (BO), data della sottoscrizione

Dott.ssa Alessandra Poggiani
CINECA-*Consorzio Interuniversitario*
La Direttrice Generale
(firmato digitalmente)
