


CINECA

DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE DELLA DIRETTRICE GENERALE

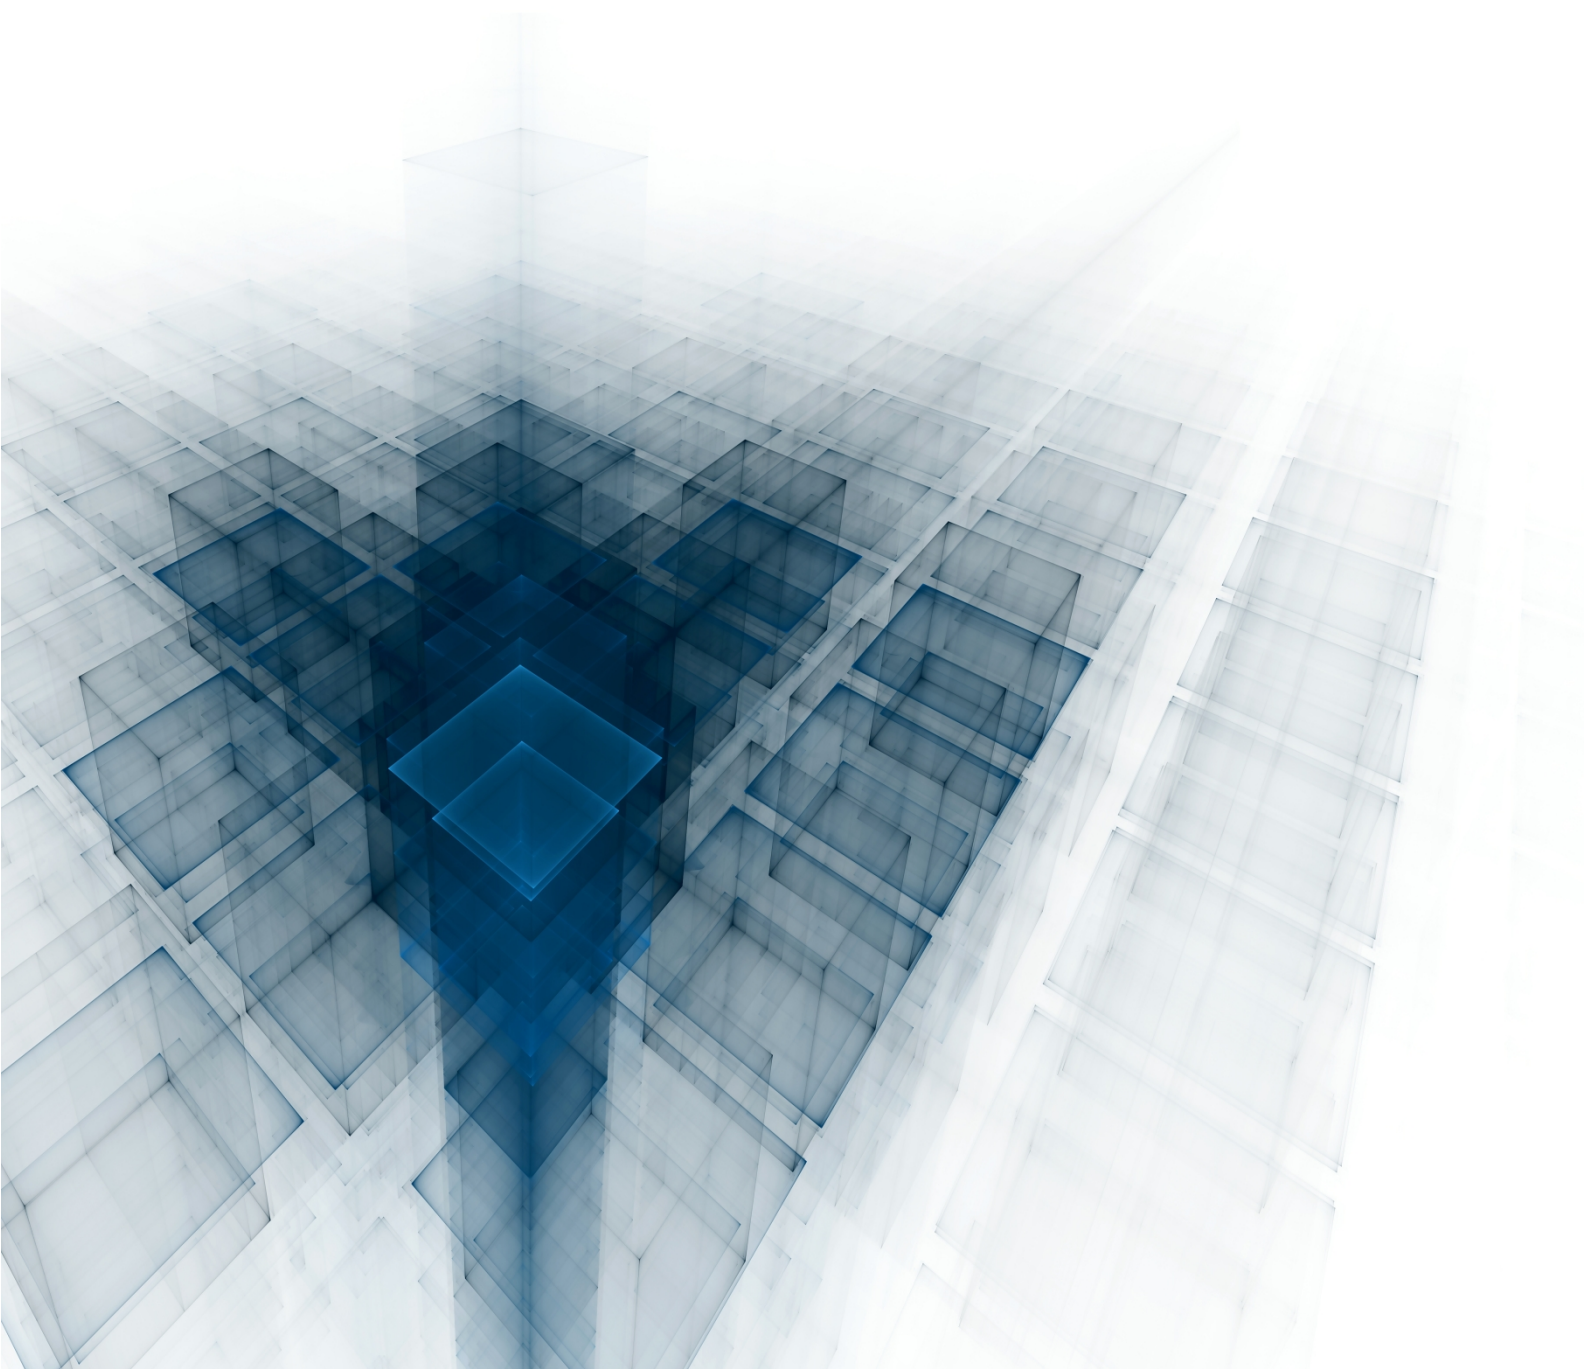

La Direttrice Generale Dott.ssa Alessandra Poggiani, su proposta di Massimo Mauri in qualità di
Responsabile Unico di Progetto nominato con Determina n. 77 del 28/02/2025

Premesso che:

- È in essere tra CINECA e l'Operatore TECTRE S.R.L. (CF. 03533961201 P.IVA 03533961201) con sede legale in Bologna (BO) via Dei Lapidari 16/B, un contratto avente ad oggetto “SERVIZIO DI RIATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIALI DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI E CONTROLLO ACCESSI PER LA SALA CED DI CASALECCHIO DI RENO – CIG B62398D579” (G01013), di importo pari ad € 126.370,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi), compensato “a corpo”, e con durata pari a 120 giorni;
- Con determina della Direttrice Generale con protocollo con re. 24/2025 è stata disposta la proroga della durata contrattuale fino al 31/12/2025;
- in fase di esecuzione si è reso necessario introdurre varianti tecniche sia al sistema di rivelazione incendi che al sistema di controllo accessi, connesse a mutate esigenze tecniche intervenute nel corso della realizzazione dei lavori relativi alla “soluzione 2e”;
- inoltre, durante l'esecuzione dei lavori di cui sopra, è emerso che il passaggio dei cavi attraverso il cavedio tecnico originariamente previsto non era tecnicamente possibile, rendendo pertanto necessaria la fornitura e posa di un quantitativo maggiore di cavi e tubazioni, con conseguente incremento dei materiali e delle lavorazioni rispetto a quanto inizialmente contrattualizzato;
- in aggiunta a quanto sopra esposto, è stato implementato un sistema centralizzato che raccoglie i segnali dai rivelatori antincendio posti nella nuova cabina elettrica del Ramo Rosso (in fase di ultimazione) e dal locale UPS del Ramo Blu per poi convogliarli al locale Apparat Speciali posto al primo piano dell'Edificio Rosso e da qua rilanciarli alla postazione di guardiania adiacente l'ingresso principale di via Magnanelli 6/3 al piano terra;
- Con determina della Direttrice Generale con protocollo con rep. 35/2025 è stata disposta la modifica dell'importo contrattuale totale da € 126.370,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) a € 139.990,00 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) e l'estensione della durata contrattuale fino al 30/06/2026;

Valutato che:

- per sopravvenute esigenze tecniche imprevedute ed imprevedibili indipendenti sia da CINECA che dall'operatore che non permettono la ultimazione dei lavori nei tempi previsto dal contratto e dalle successive determine, si rende necessaria una modifica del contratto succitato nei termini di una estensione della durata contrattuale fino al 31/12/2026;

- nello specifico, durante la esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria oggetto del presente contratto, si è rilevata la impossibilità da parte del sistema di controllo accessi di leggere, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, le tessere badge in disponibilità del personale di CINECA e che quindi tale problema tecnico, ancora in fase di valutazione ed approfondimento, non permette la messa in funzione del sistema e la ultimazione dei lavori di cui al presente contratto;
- le attività necessarie al completamento dei lavori riguardano pertanto le verifiche di compatibilità delle tessere badge con l'impianto di controllo accessi e le eventuali operazioni di riconfigurazione e programmazione del sistema di controllo accessi per avere la piena funzionalità del sistema;
- la modifica della durata contrattuale è riconducibile all'art. 120, comma 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023, in quanto resa necessaria da sopravvenute circostanze impreviste e imprevedibili che impediscono il completamento delle prestazioni nei termini originariamente previsti, senza variazione del corrispettivo contrattuale oltre che rientrano tra quelle contrattualmente previste all'art. 7.

Visti:

- l'art. 7 del contratto in essere relativo alla procedura G01013;
- l'art. 120 comma 1 lett. c) del d.lgs. 36/2023;
- la procura rilasciata alla sottoscritta, quale Direttrice Generale;
- che l'importo è stato inserito nel budget 2026-2028 alla voce MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI;

Determina

- di autorizzare il RUP, a procedere con le attività di formalizzazione della modifica del contratto descritto in premessa e nei termini sopra citati con relativa modifica del contratto succitato nei termini di una estensione della durata contrattuale fino al 31/12/2026;
- di dare atto, pertanto, della estensione della durata contrattuale fino al 31/12/2026;
- di autorizzare le necessarie modifiche del CIG;
- che la formalizzazione avverrà per il tramite del Portale Appalti del CINECA;
- che la presente venga pubblicata in applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023.

Dott.ssa Alessandra Poggiani
CINECA-*Consorzio Interuniversitario*
La Direttrice Generale
(firmato digitalmente)
