




**DETERMINA DI MODIFICA
CONTRATTUALE DELLA DIRETTRICE
GENERALE**

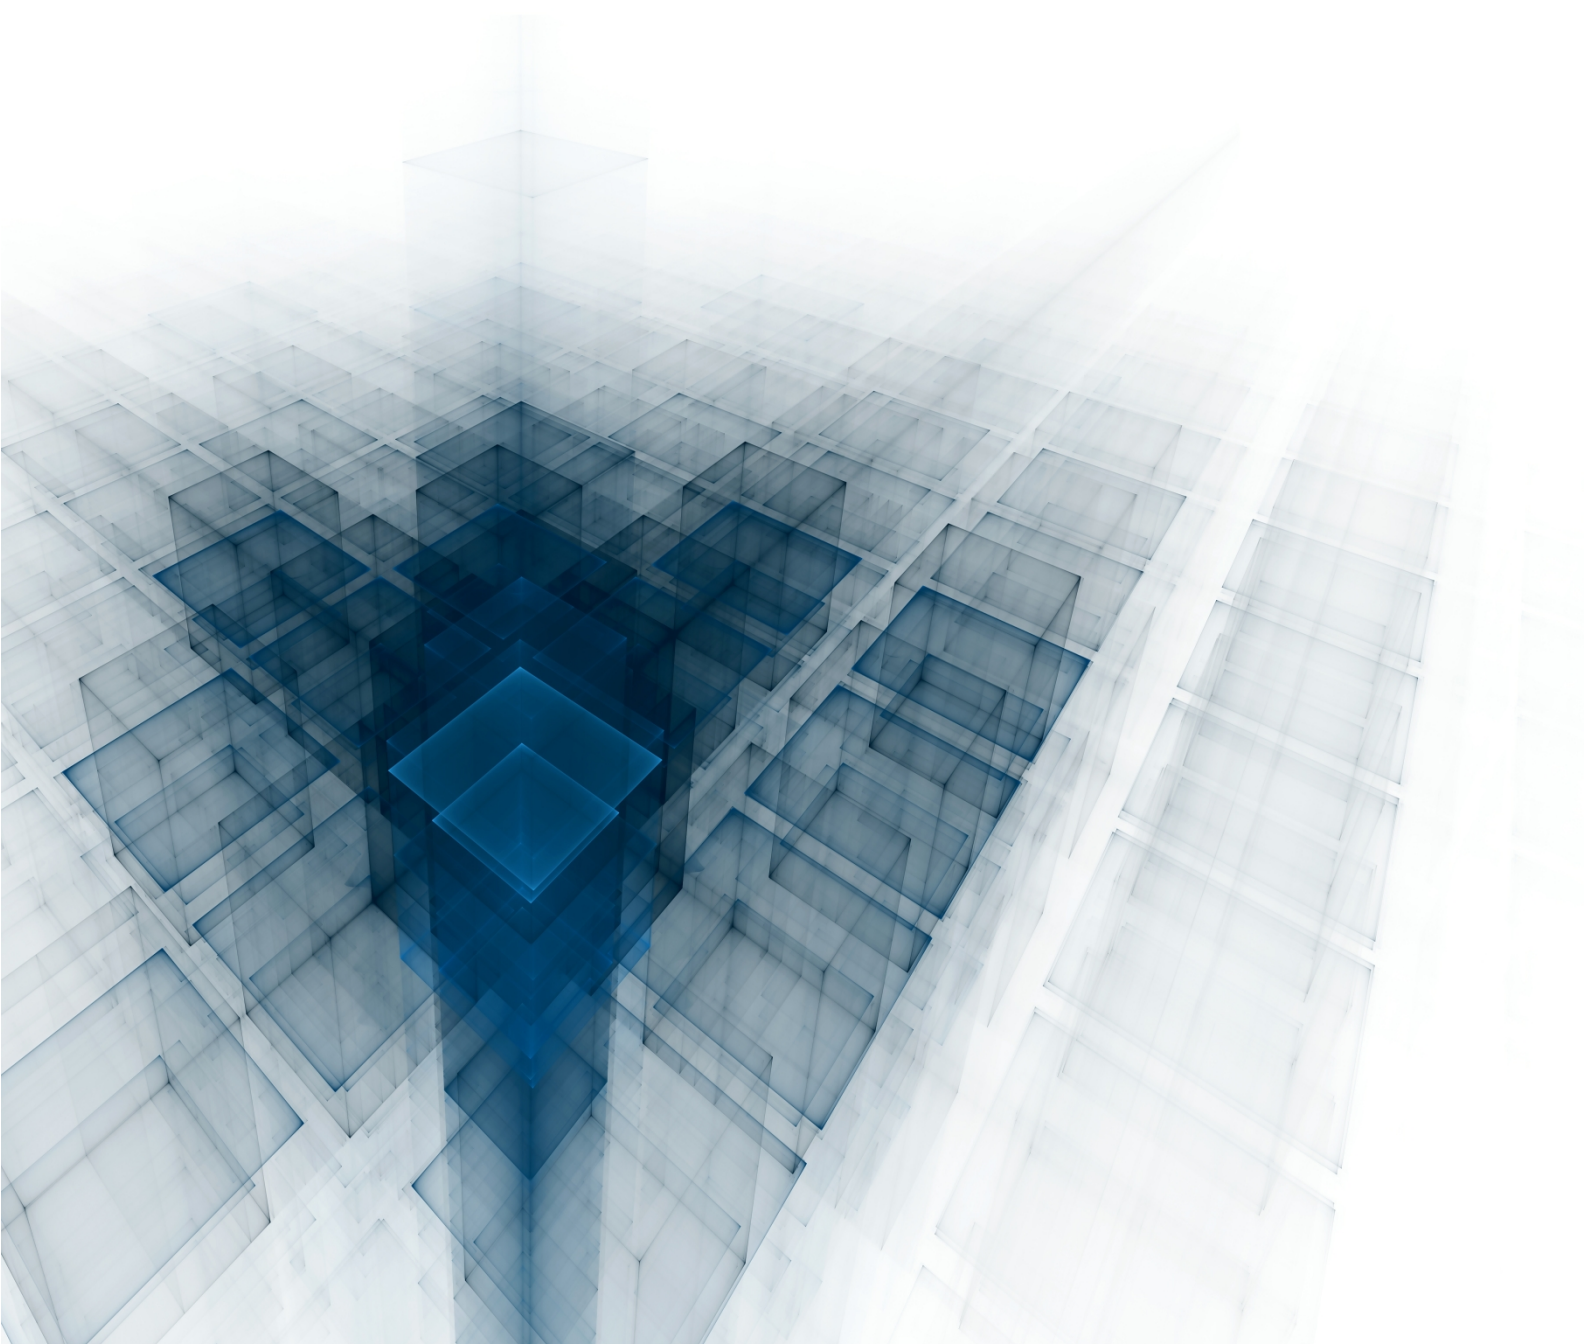

La Direttrice Generale Dott.ssa Alessandra Poggiani, su proposta dell'Arch. Massimo Mauri in qualità di
Responsabile Unico di Progetto nominato con Determina n. 22/2025

Premesso che:

- è in essere tra CINECA e l'Operatore MES Security S.r.l. con sede in San Lazzaro di Savena (BO) alla Via Cicogna 38/c C.F./P. IVA 02888691207 telefono 051.0953300 PEC mes-group@pec.it e-mail, un contratto avente ad oggetto SERVIZIO DI PRESIDIO DIFFERENZIATO TEMPORANEO IN AMBITO ANTINCENDIO CIG B7391A4973 (G01074) di importo pari ad € 39.978,75 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) e con durata 4 mesi e comunque fino alla conclusione delle attività legate al ripristino delle condizioni di sicurezza connesse al termine delle lavorazioni per la realizzazione degli impianti definiti nella soluzione 2e;
- con determina della Direttrice Generale n.26/2025 è stata autorizzata una modifica con aumento contrattuale di ulteriori € 7.995,75 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi), portando l'importo contrattuale a € 47.974,50 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);
- in fase di esecuzione contrattuale, sono sopravvenute esigenze che rendono necessario disporre, per un periodo ulteriore, del servizio di presidio antincendio differenziato temporaneo. Tale necessità deriva dalla mancata conclusione delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza, correlate al completamento delle lavorazioni previste per la realizzazione degli impianti individuati nella soluzione 2E;
- le lavorazioni per la realizzazione degli impianti individuati nella soluzione 2E hanno subito un rallentamento derivante dal fatto che la disconnessione e il collegamento, dai vecchi a nuovi impianti, delle apparecchiature ICT mission critical ospitate nelle sale server, deve avvenire gradualmente e in fasce temporali determinate, tali da non creare una interruzione dei servizi erogati dal Consorzio;
- si rende pertanto indispensabile prorogare l'attivazione della misura compensativa costituita dal presidio antincendio, onde assicurare la corretta disconnessione ed il relativo collegamento – ai nuovi impianti – delle apparecchiature ICT mission critical al fine di garantire la sicurezza del Consorzio e prevenire situazioni di rischio derivanti dall'attuale stato degli impianti;
- ultimate le operazioni di cui al punto precedente, sarà possibile procedere al completamento delle lavorazioni attinenti alla realizzazione degli impianti rientranti nella soluzione 2E;

Valutato che:

- tali modifiche rientrano nell'ipotesi di cui all' art. 120, comma 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023, nei limiti dell'importo di cui all'art. 120 comma 2;
- le succitate modifiche rientrano nell'ambito delle previsioni contrattuali di cui all'art.2;
- si stima un aumento di importo contrattuale di € 11.993,62 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);

Visti:

- l'art. 2 delle condizioni generali di contratto in essere relativo alla procedura G01074;
- l'art. 120 comma 1 lett. c) del d.lgs. 36/2023 in combinato disposto con l'art. 120 comma 2 del d.lgs.36/2023;
- la procura rilasciata in data 20/09/2023 alla sottoscritta, quale Direttrice Generale;
- che l'importo trova capienza nel DPP Consortile alla voce SERVIZI RICEVUTI DA TERZI;

Determina

- di autorizzare il RUP, a procedere con le attività di formalizzazione della modifica del contratto descritto in premessa e nei termini sopra citati con relativo aumento contrattuale di ulteriori € 11.993,62 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);
- di dare atto, pertanto, che l'importo contrattuale totale viene pertanto aumentato da € 47.974,50 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi) a € 59.968,12 (IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi);
- di autorizzare le necessarie modifiche del CIG;
- che la formalizzazione avverrà per il tramite del Portale Appalti del CINECA;
- che la presente venga pubblicata in applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023;

Casalecchio di Reno (BO)

Dott.ssa Alessandra Poggiani

CINECA-Consorzio Interuniversitario

La Direttrice Generale

(firmato digitalmente)
